



L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79

Relatório Diário de Obra e Relatório Fotográfico		RDO nº:	03
		Contrato:	057/CMVA/2022
Obra:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI		Prazo Contratual: 150 dias
Local:	RUA BOA VISTA, Nº 2678, CENTRO – VALE DO ANARI		Data do Relatório: 28/01/2023 á 08/02/2023
Cliente:	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas semanalmente	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:30		Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 13:00		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Nota*: Em caso de ocorrência de chuva será comentado no campo de observações;

Mão de Obra (4)						
Ajudante Geral 2	Pedreiro 1					Mão de Obra Direta (3)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (6)					
Furadeira 1	Serra de mármore 1	Carrinho de mão 1	Martelo 2	Cavadeira 1	Betoneira


Atividades / Tarefas (6)	
Limpeza e organização do canteiro	Em andamento
Concretagem dos pilares	Em andamento
Concretagem das vigas de respaldo	Em andamento
Execução de verga e contraverga	Finalizada
Execução de alvenaria	Em andamento
Aplicação de massa acrílica, fundo selador e pintura da edificação existente	Finalizada

Ocorrências / Observações (1)
Aproveitando a diminuição da chuva durante o fim de janeiro e início de fevereiro, finalizamos a pintura externa da parte existente da edificação.



L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79

Galeria de Fotos:

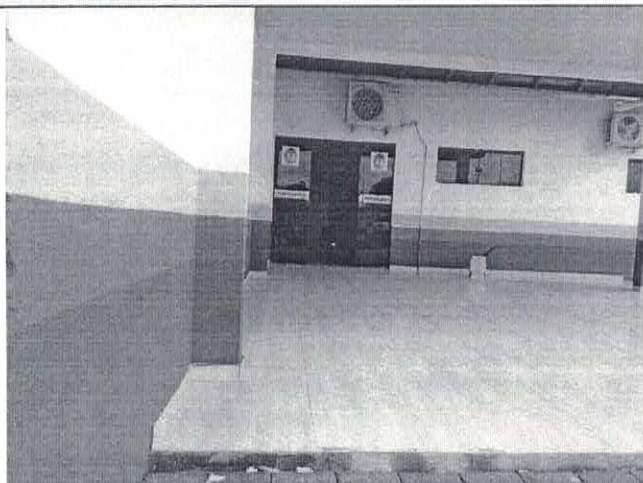


1. Execução da pintura externa;




2. Execução da pintura externa;



3. Execução da pintura externa;

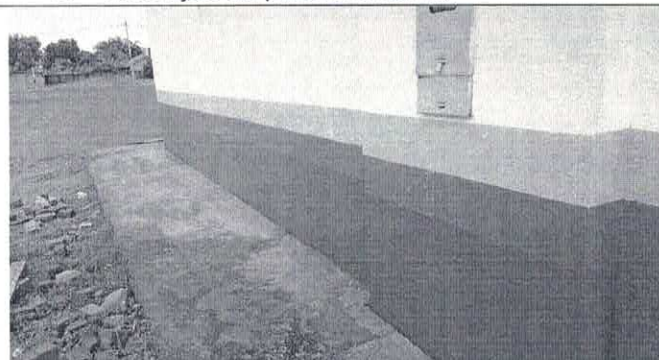

4. Execução da pintura externa;

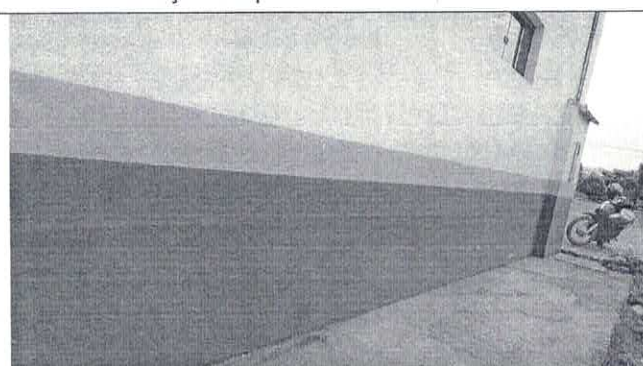


5. Execução da pintura externa;



6. Concretagem das vigas baldrame;




L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79

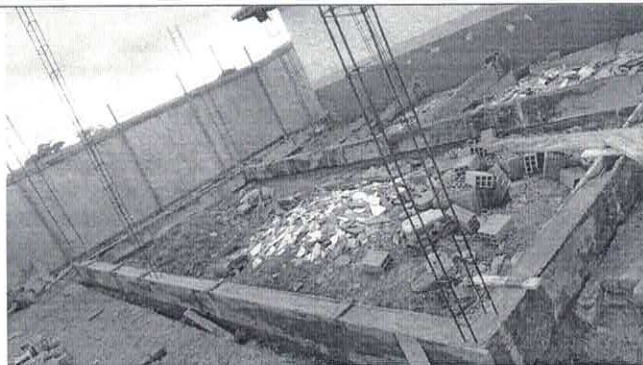


7. Execução das vigas baldrame;




8. Execução da alvenaria de vedação;

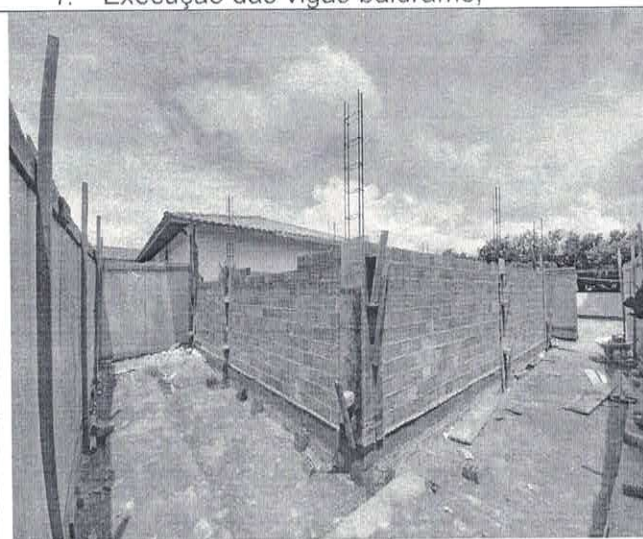


9. Execução da alvenaria de vedação;

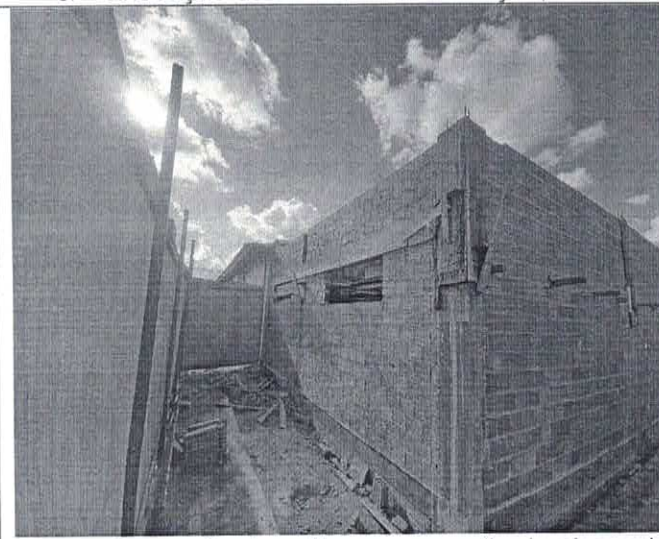

10. Execução dos pilares, execução da alvenaria de vedação e viga respaldo;

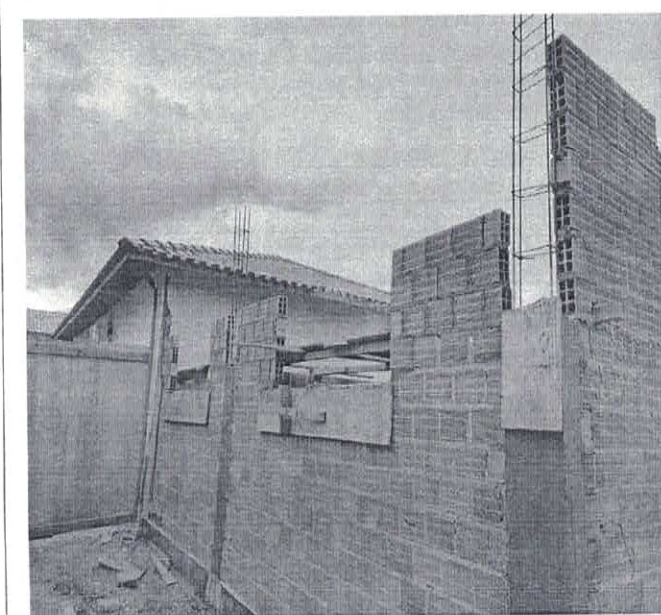


11. Execução dos pilares, verga e contraverga e execução da alvenaria de vedação;

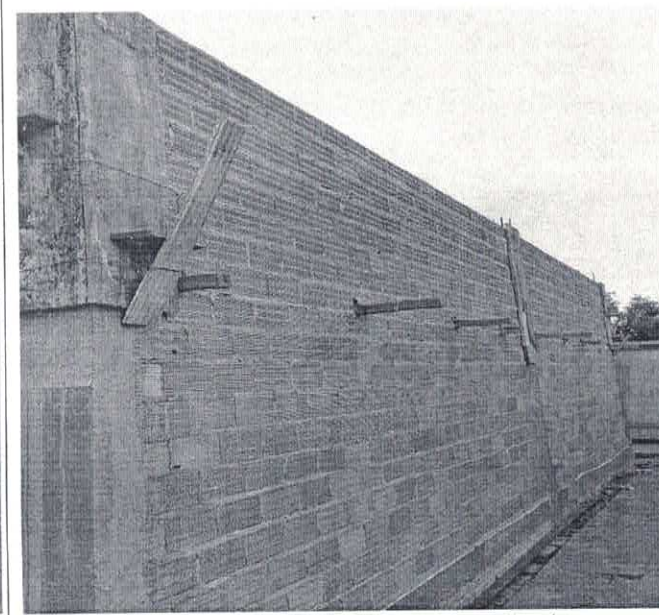


12. Execução dos pilares e execução da alvenaria de vedação;




L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79

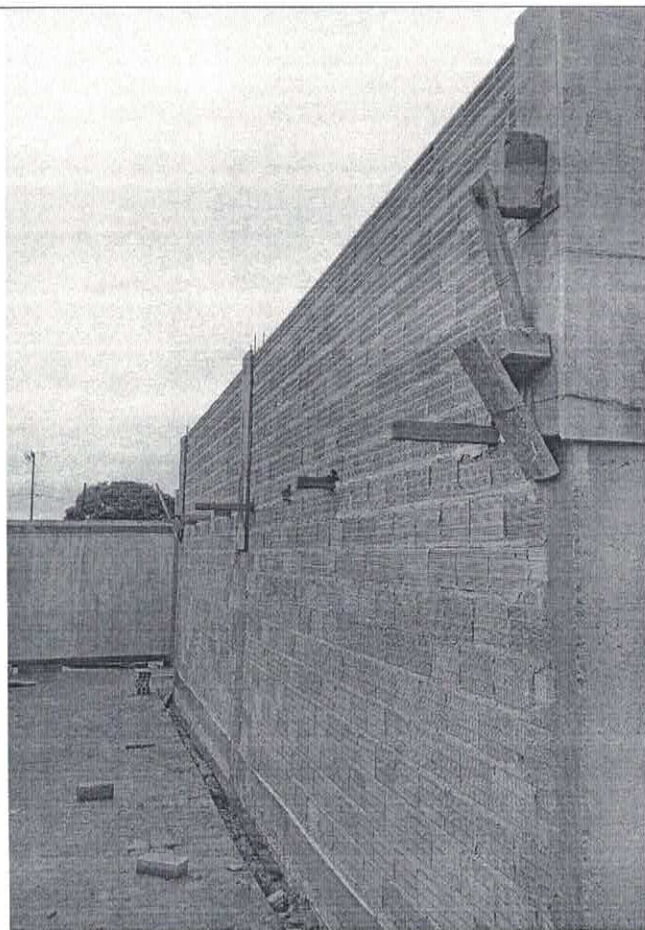


13. Execução dos pilares e execução da alvenaria de vedação;

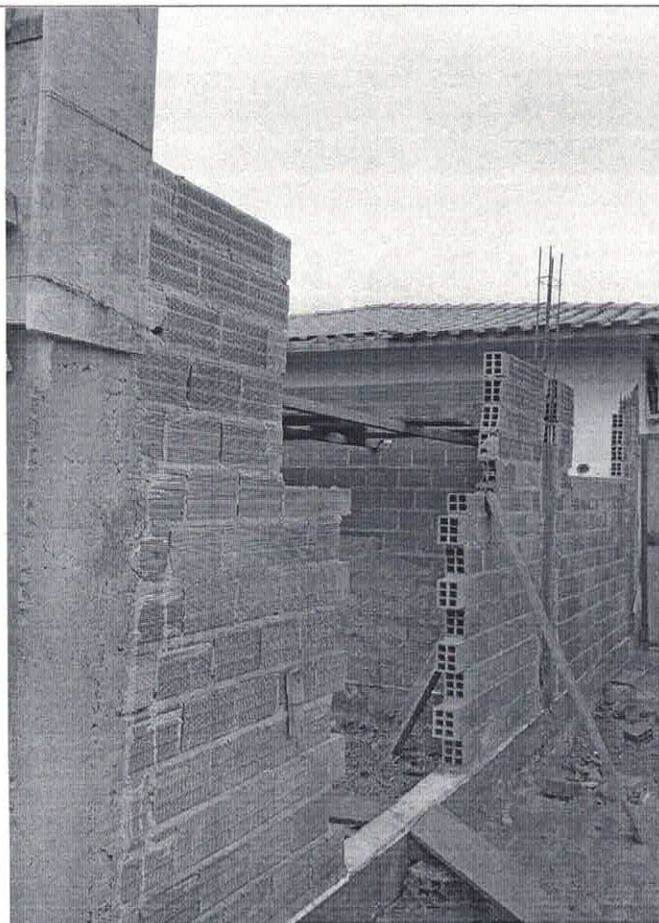

14. Execução dos pilares e execução da alvenaria de vedação;

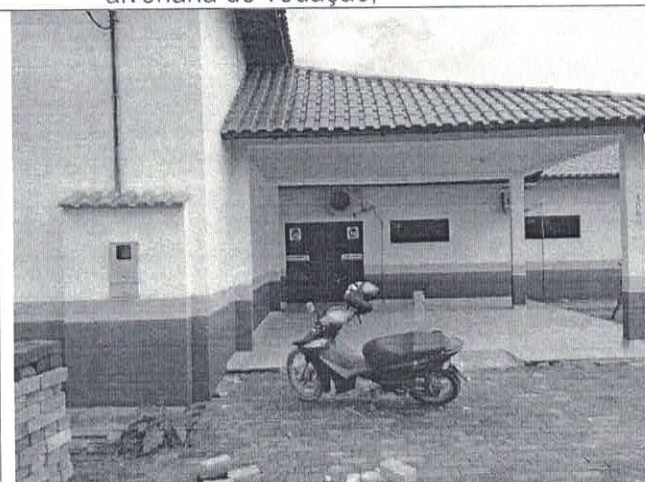

15. Pintura finalizada na parte externa;

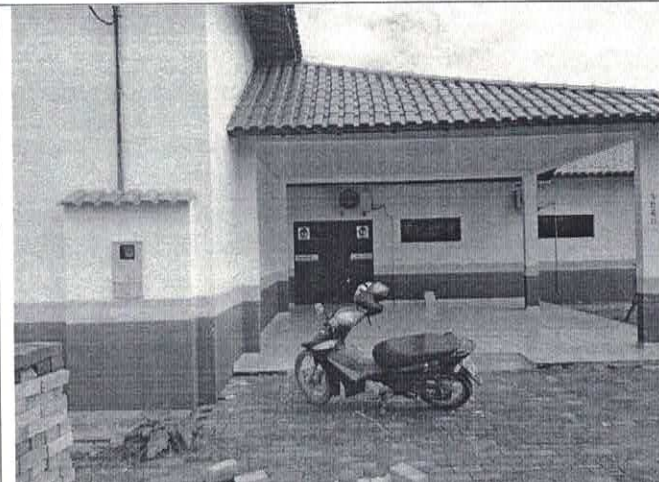


16. Pintura finalizada na parte externa;




L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79




17. Pintura finalizada na parte externa;

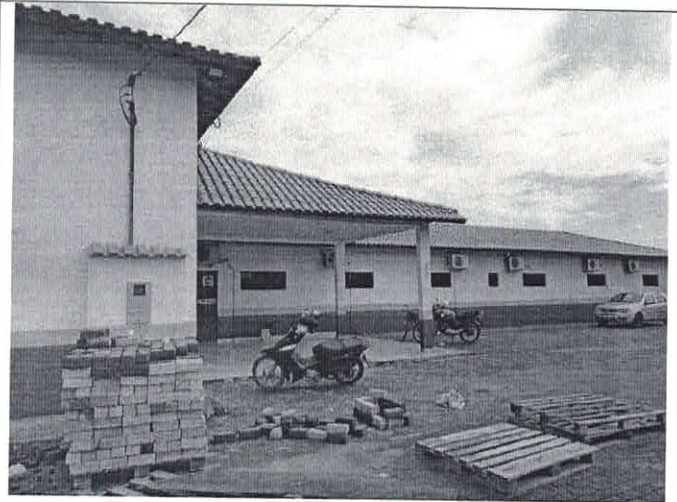


18. Pintura finalizada na parte externa;

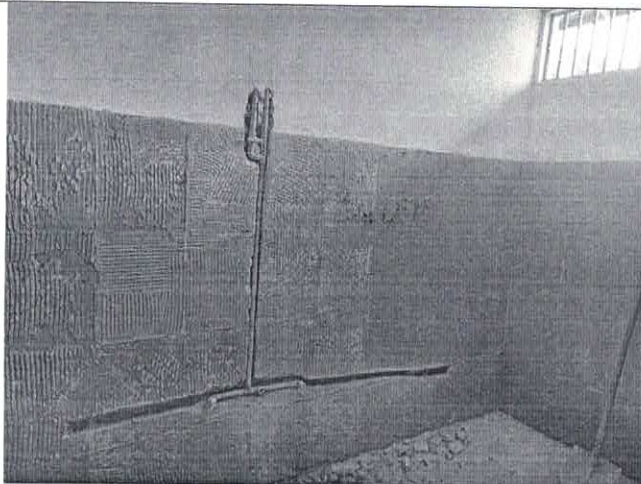


19. Remoção do revestimento cerâmico e das louças/peças sanitárias;

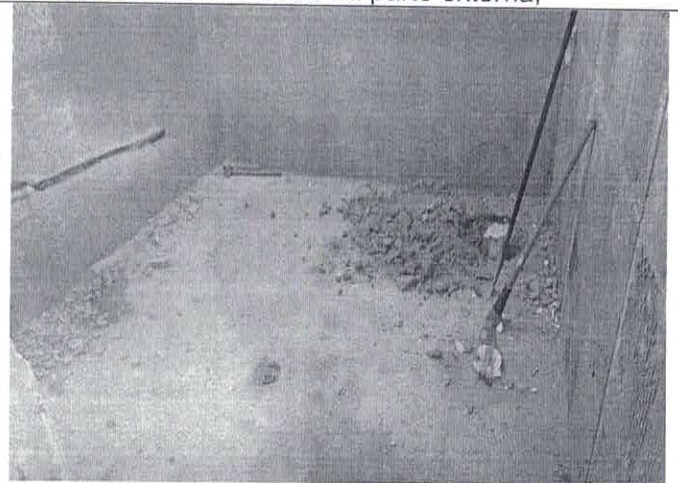

20. Remoção do revestimento cerâmico e das louças/peças sanitárias;

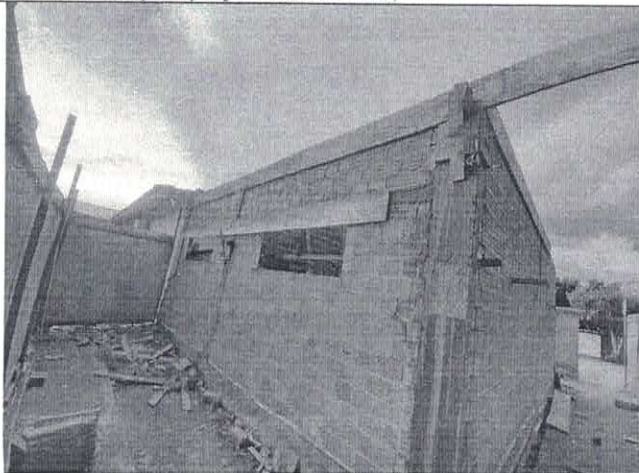

21. Execução da viga de respaldo, verga e contraverga e execução da alvenaria de vedação;

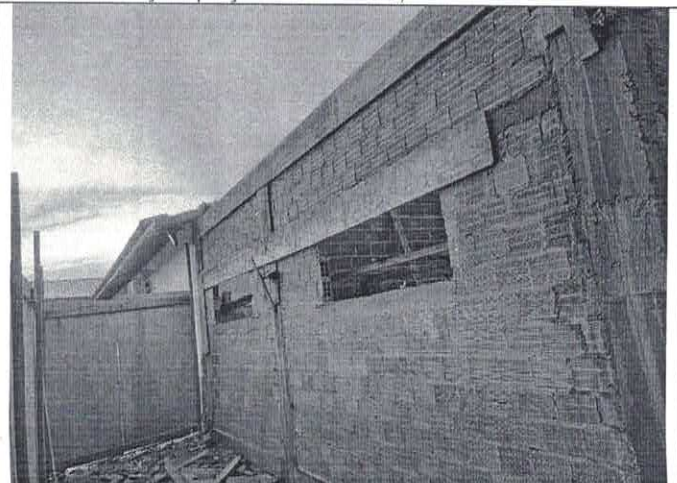

22. Execução da viga de respaldo, verga e contraverga e execução da alvenaria de vedação;



L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79

PETHERSON PETHERSON
LEMO DE LEMO DE PAULA
PAULA DA DA
SILVA:01612702 SILVA:01612702201
201 2023.02.09 07:59:00
-04'00"

RESPONSÁVEL TÉCNICO
TRIÂNGULO CONSTRUTORA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
CONTRATANTE
