



L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79

Relatório Diário de Obra e Relatório Fotográfico		RDO nº:	02
		Contrato:	057/CMVA/2022
Obra:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	Prazo Contratual:	150 dias
Local:	RUA BOA VISTA, Nº 2678, CENTRO – VALE DO ANARI	Data do Relatório:	27/12/2022 á 27/01/2023
Cliente:	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas semanalmente	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:30		Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável
		44			

Nota*: Em caso de ocorrência de chuva será comentado no campo de observações;

Mão de Obra (4)						
Ajudante Geral 2	Pedreiro 1					Mão de Obra Direta (3)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (6)					
Furadeira 1	Serra de mármore 1	Carrinho de mão 1	Martelo 2	Cavadeira 1	

Atividades / Tarefas (6)	
Limpeza e organização do canteiro	Em andamento
Escavação das sapatas	Finalizado
Escavação para alvenaria de embasamento e vigas baldrame;	Finalizado
Reaterro das sapatas	Finalizado
Concretagem das vigas baldrame	Em andamento
Execução da armação dos pilares	Em andamento
Raspagem e lixamento da parte interna da edificação	Em andamento
Aplicação de massa acrílica, fundo selador e pintura	Em andamento

Ocorrências / Observações (1)
Chuva constante durante na primeira semana de janeiro, sendo assim a alternativa foi pintar a parte interna da edificação.



L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79


Galeria de Fotos:




1. Escavação das sapatas e vigas;





2. Escavação das sapatas e vigas;

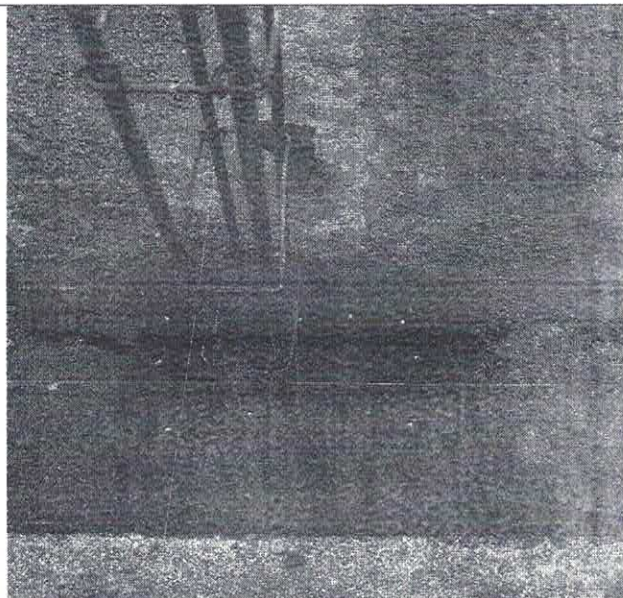

3. Execução da armação das sapatas;

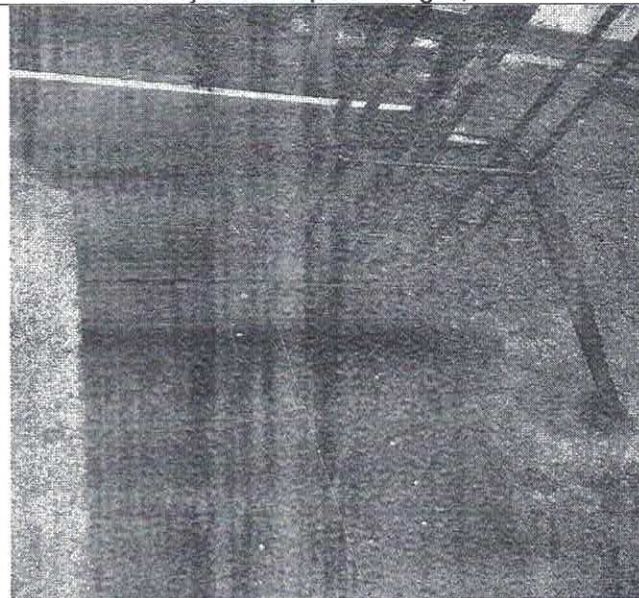


4. Execução da armação das sapatas;

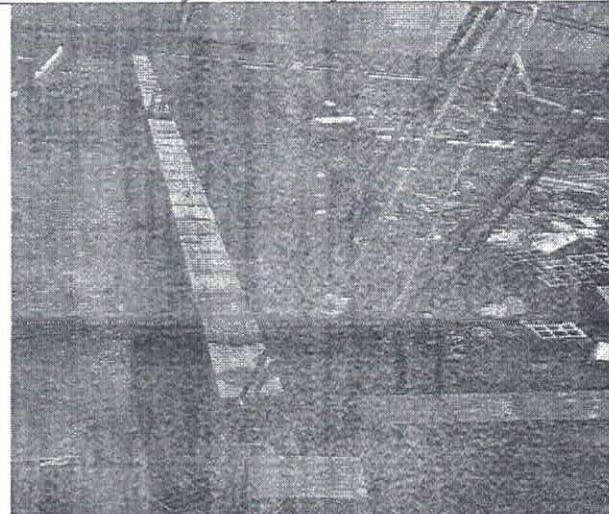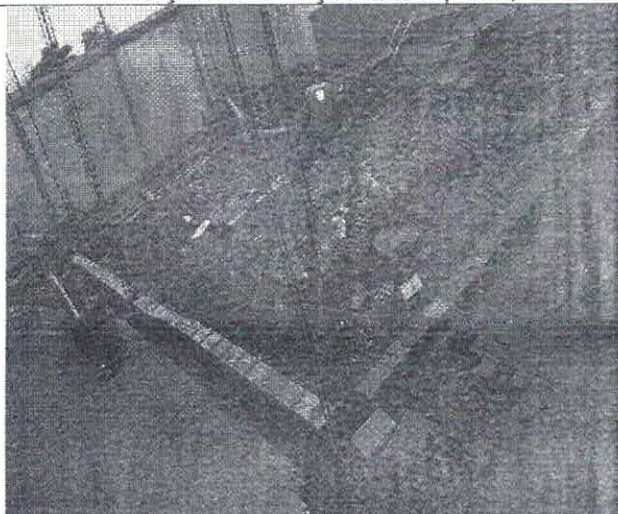




L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79


5. Concretagem das sapatas e execução da alvenaria de embasamento;

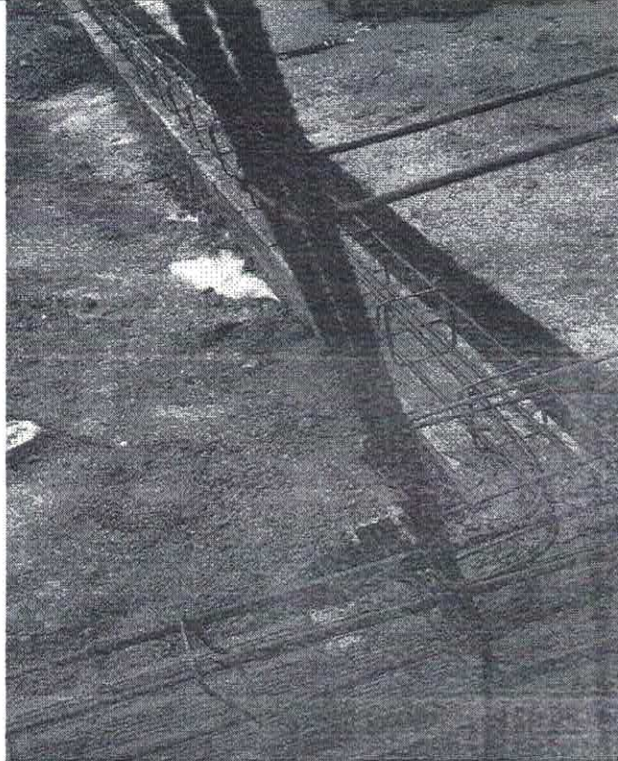


6. Concretagem das sapatas e execução da alvenaria de embasamento;

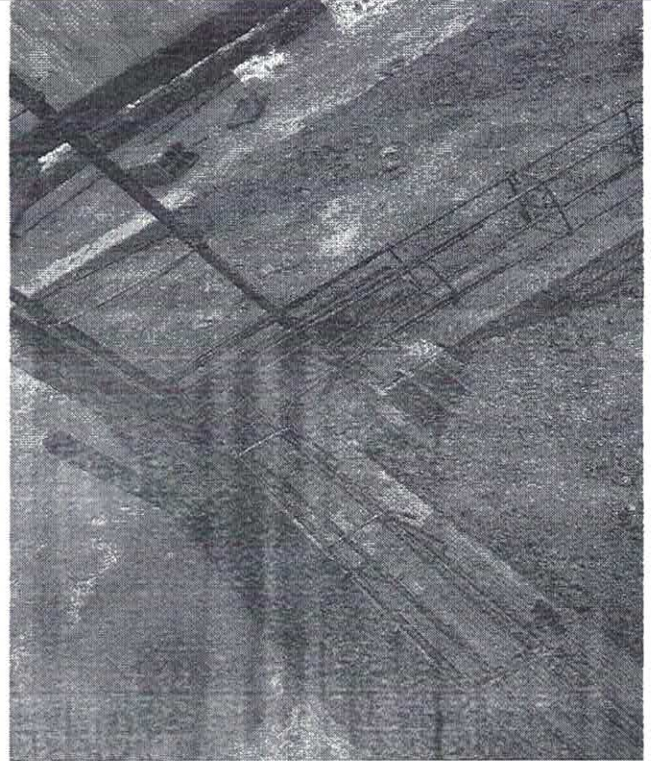

7. Execução das vigas baldrame;


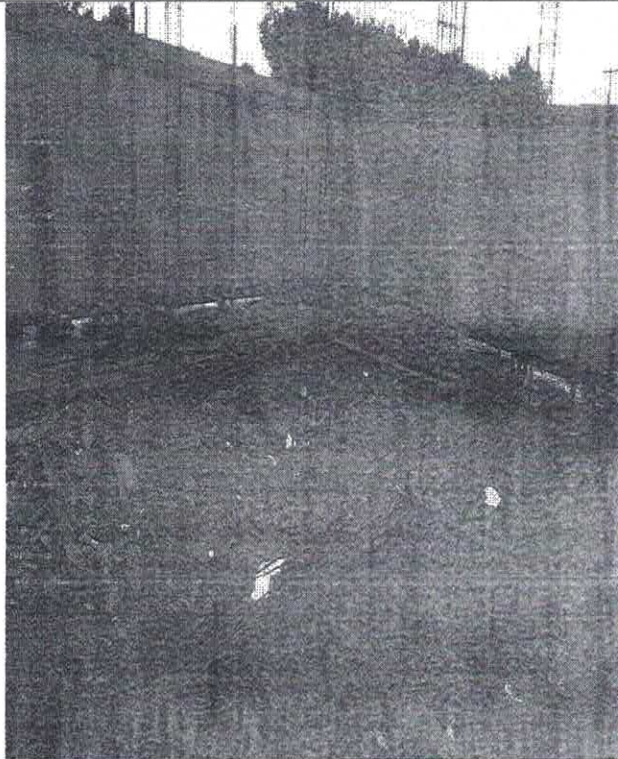


8. Execução das vigas baldrame;

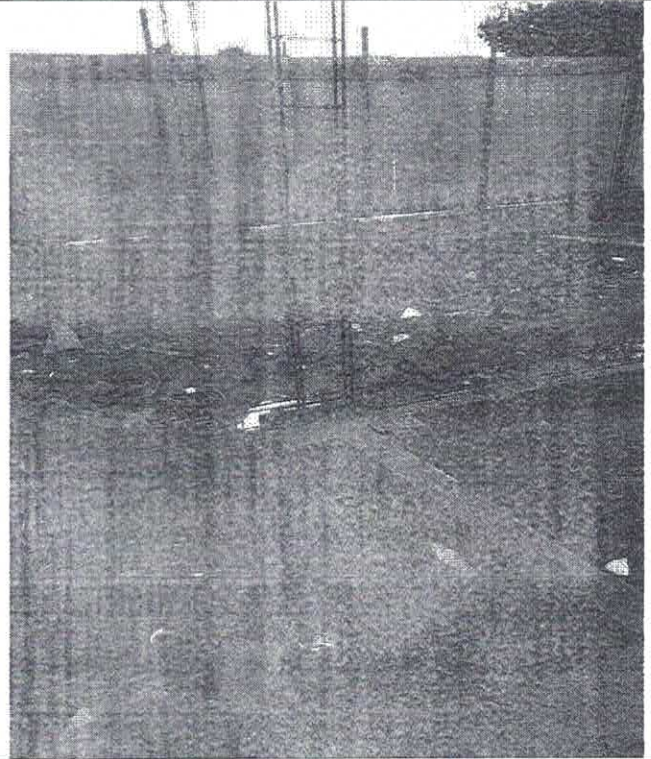




L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79

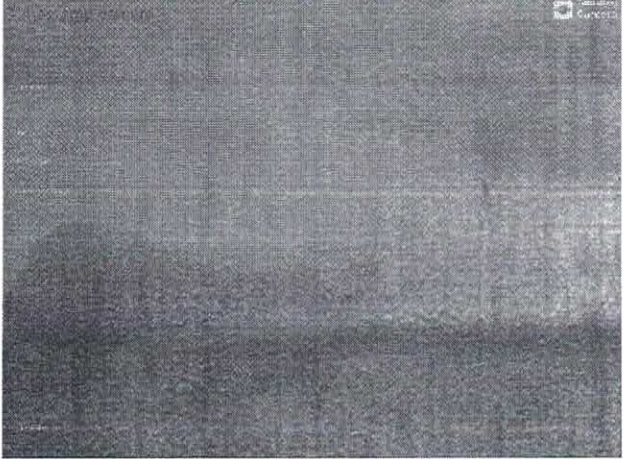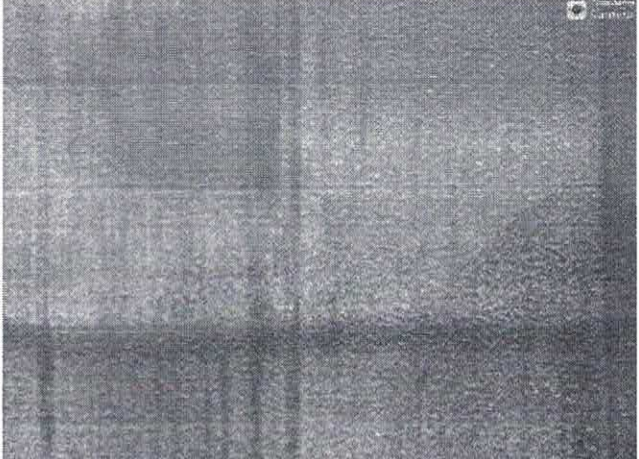
9. Execução das vigas baldrame e pilares; 	10. Execução das vigas baldrame e pilares; 
11. Execução das vigas baldrame e pilares; 	12. Execução das vigas baldrame e pilares; 
13. Raspagem e lixamento para aplicação de massa acrílica, selador e pintura;	14. Raspagem e lixamento para aplicação de massa acrílica, selador e pintura;




L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79

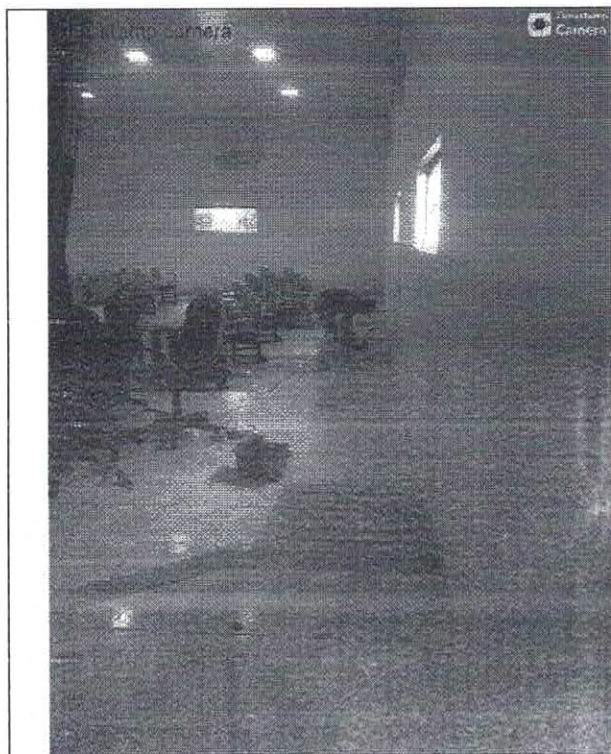


15. Aplicação de massa acrílica e pintura;

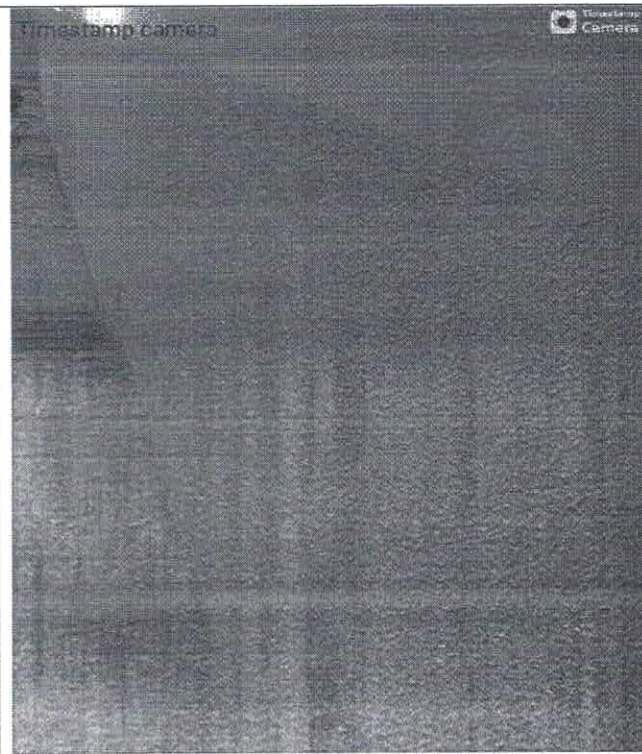

16. Aplicação de massa acrílica e pintura;

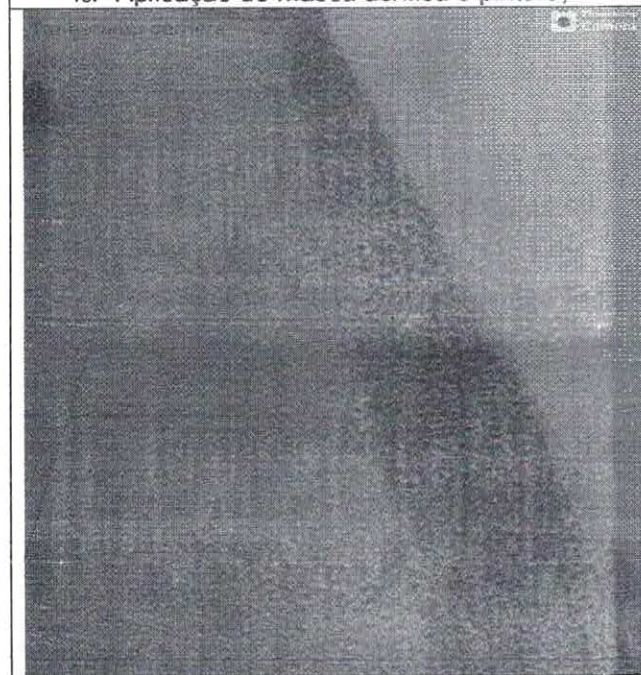

17. Raspagem e lixamento para aplicação de massa acrílica, selador e pintura;

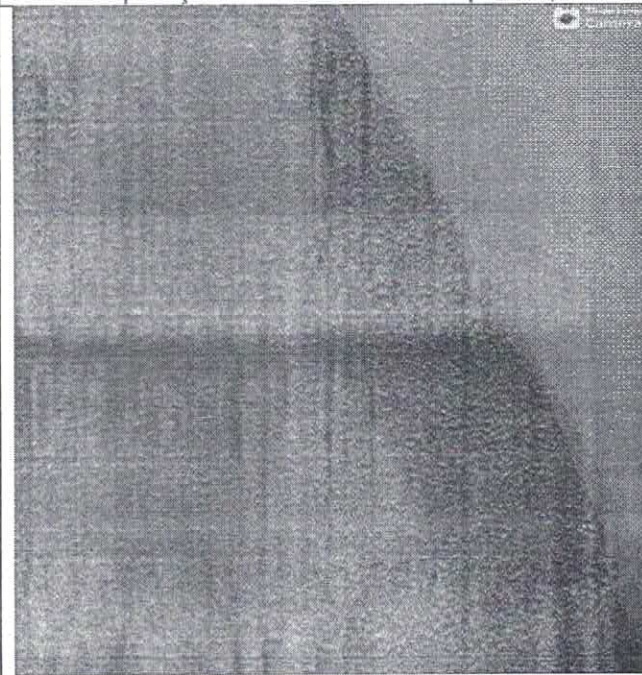


18. Raspagem e lixamento para aplicação de massa acrílica, selador e pintura;



L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79




19. Raspagem e lixamento para aplicação de massa acrílica, selador e pintura;

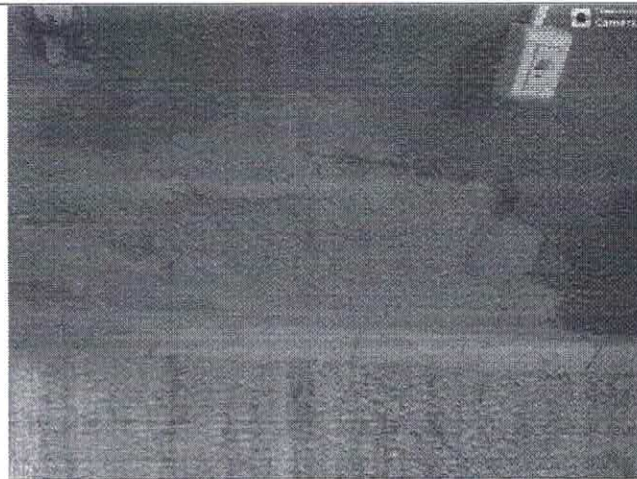

20. Raspagem e lixamento para aplicação de massa acrílica, selador e pintura;




21. Raspagem e lixamento para aplicação de massa acrílica, selador e pintura;

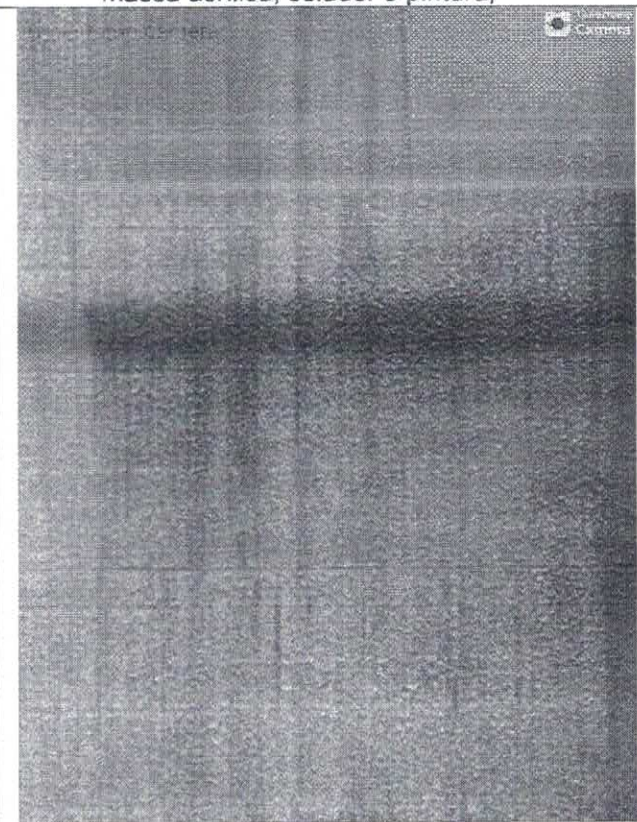

22. Raspagem e lixamento para aplicação de massa acrílica, selador e pintura;



L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79

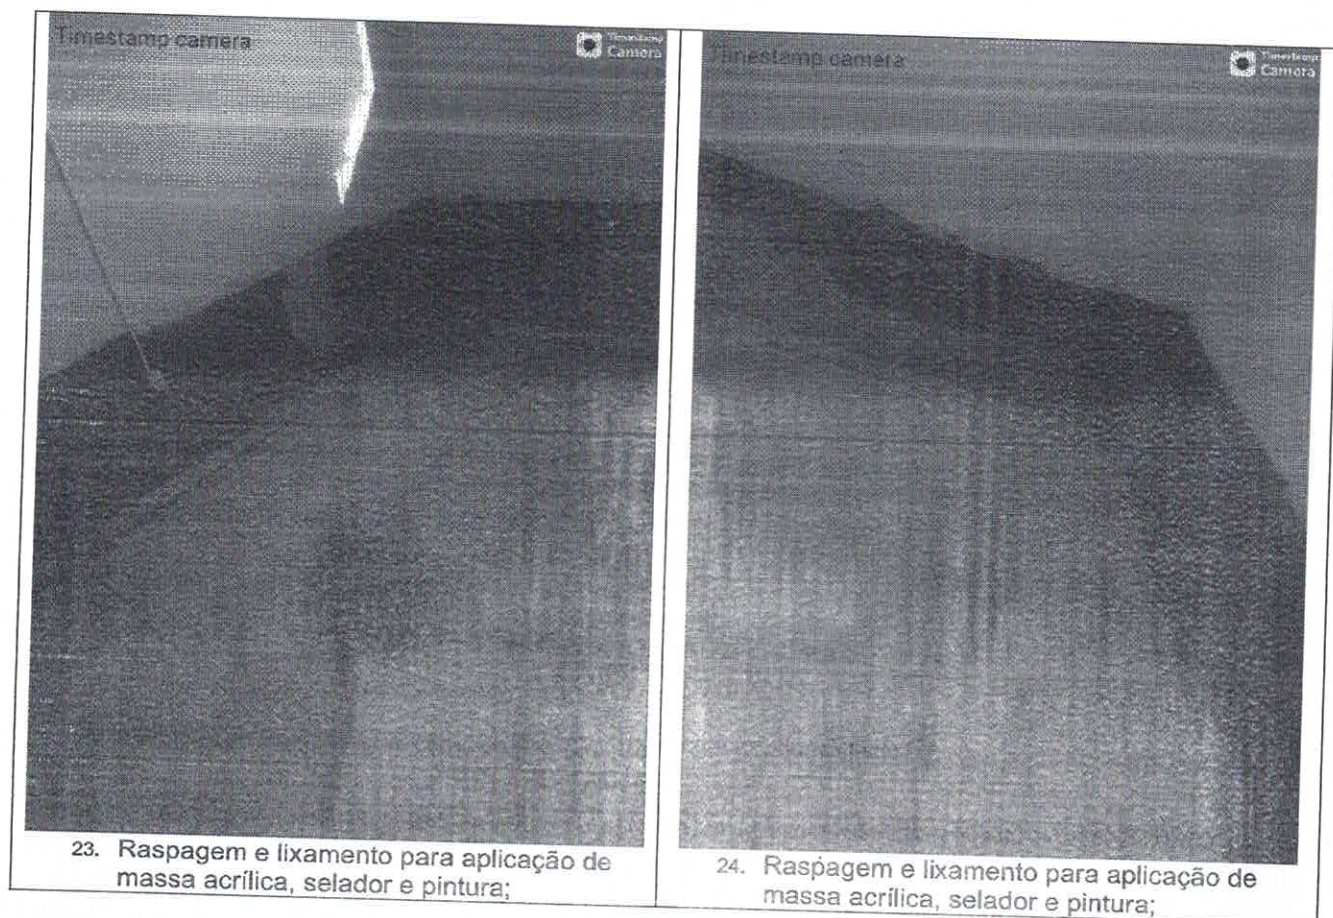

23. Raspagem e lixamento para aplicação de massa acrílica, selador e pintura;

24. Raspagem e lixamento para aplicação de massa acrílica, selador e pintura;

PETHERSON PETHERSON LEMOS
LEMONS DE PAULA DA
PAULA DA SILVA 01612702201
SILVA:01612702201 2023.01.31
01 0400

RESPONSÁVEL TÉCNICO
TRIÂNGULO CONSTRUTORA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
CONTRATANTE

RUA DOM AUGUSTO, 892, CENTRO, JI-PARANÁ/RONDÔNIA, CEP 76900-077
EMAIL: trianguloengenhariaarquitectura@gmail.com
