



L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79

Relatório Diário de Obra e Relatório Fotográfico	
Obra:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Local:	RUA BOA VISTA, Nº 2678, CENTRO – VALE DO ANARI
Cliente:	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Horário de trabalho	
Entrada / Saída	07:00 - 17:30
Intervalo	11:30 - 13:00
44	
Horas trabalhadas semanalmente	
Condição climática	
Tempo	☀ Claro
Manhã	☀ Claro
Tarde	☀ Claro
Condição	
Praticável	Praticável
Data do Relatório: 09/02/2023 à 07/03/2023	
Contrato: 057/CMVA/2022	Prazo Contratual: 150 dias
RDO nº: 04	

Nota*: Em caso de ocorrência de chuva será comentado no campo de observações;

Mão de Obra (4)					
Ajudante Geral	2	Pedreiro	1		
Engenheiro	1				
Equipamentos (6)					
Furadeira	1	Serra de mármore	1	Carrinho de mão	1
				Martelo	2
				Cavadeira	1
				Betoneira	

Atividades / Tarefas (6)	
Limpeza e organização do canteiro	
Remoção das portas	Em andamento
Demolição de alvenaria	Em andamento
Execução de chapisco e reboco	Finalizada
Execução de contrapiso	Finalizada
Execução de cobertura e telhamento	Em andamento
Ocorrências / Observações (1)	

RUA DOM AUGUSTO, 892, CENTRO, JI-PARANA/RONDÔNIA, CEP 76900-077
EMAIL: trianguloengenhariaarquitetura@gmail.com



L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79

Galeria de Fotos:



1. Execução chapisco e reboco;



3. Execução de reboco e aterro interno;



2. Execução de reboco e aterro interno;




4. Execução das tesouras e reboco

RUA DOM AUGUSTO, 892, CENTRO, JI-PARANA/RONDÔNIA, CEP 76900-077
EMAIL: trianguloengenhariaarquitectura@gmail.com



L. DALCIND CAVATI LTDA
CNPJ: 26.747.076/0001-79

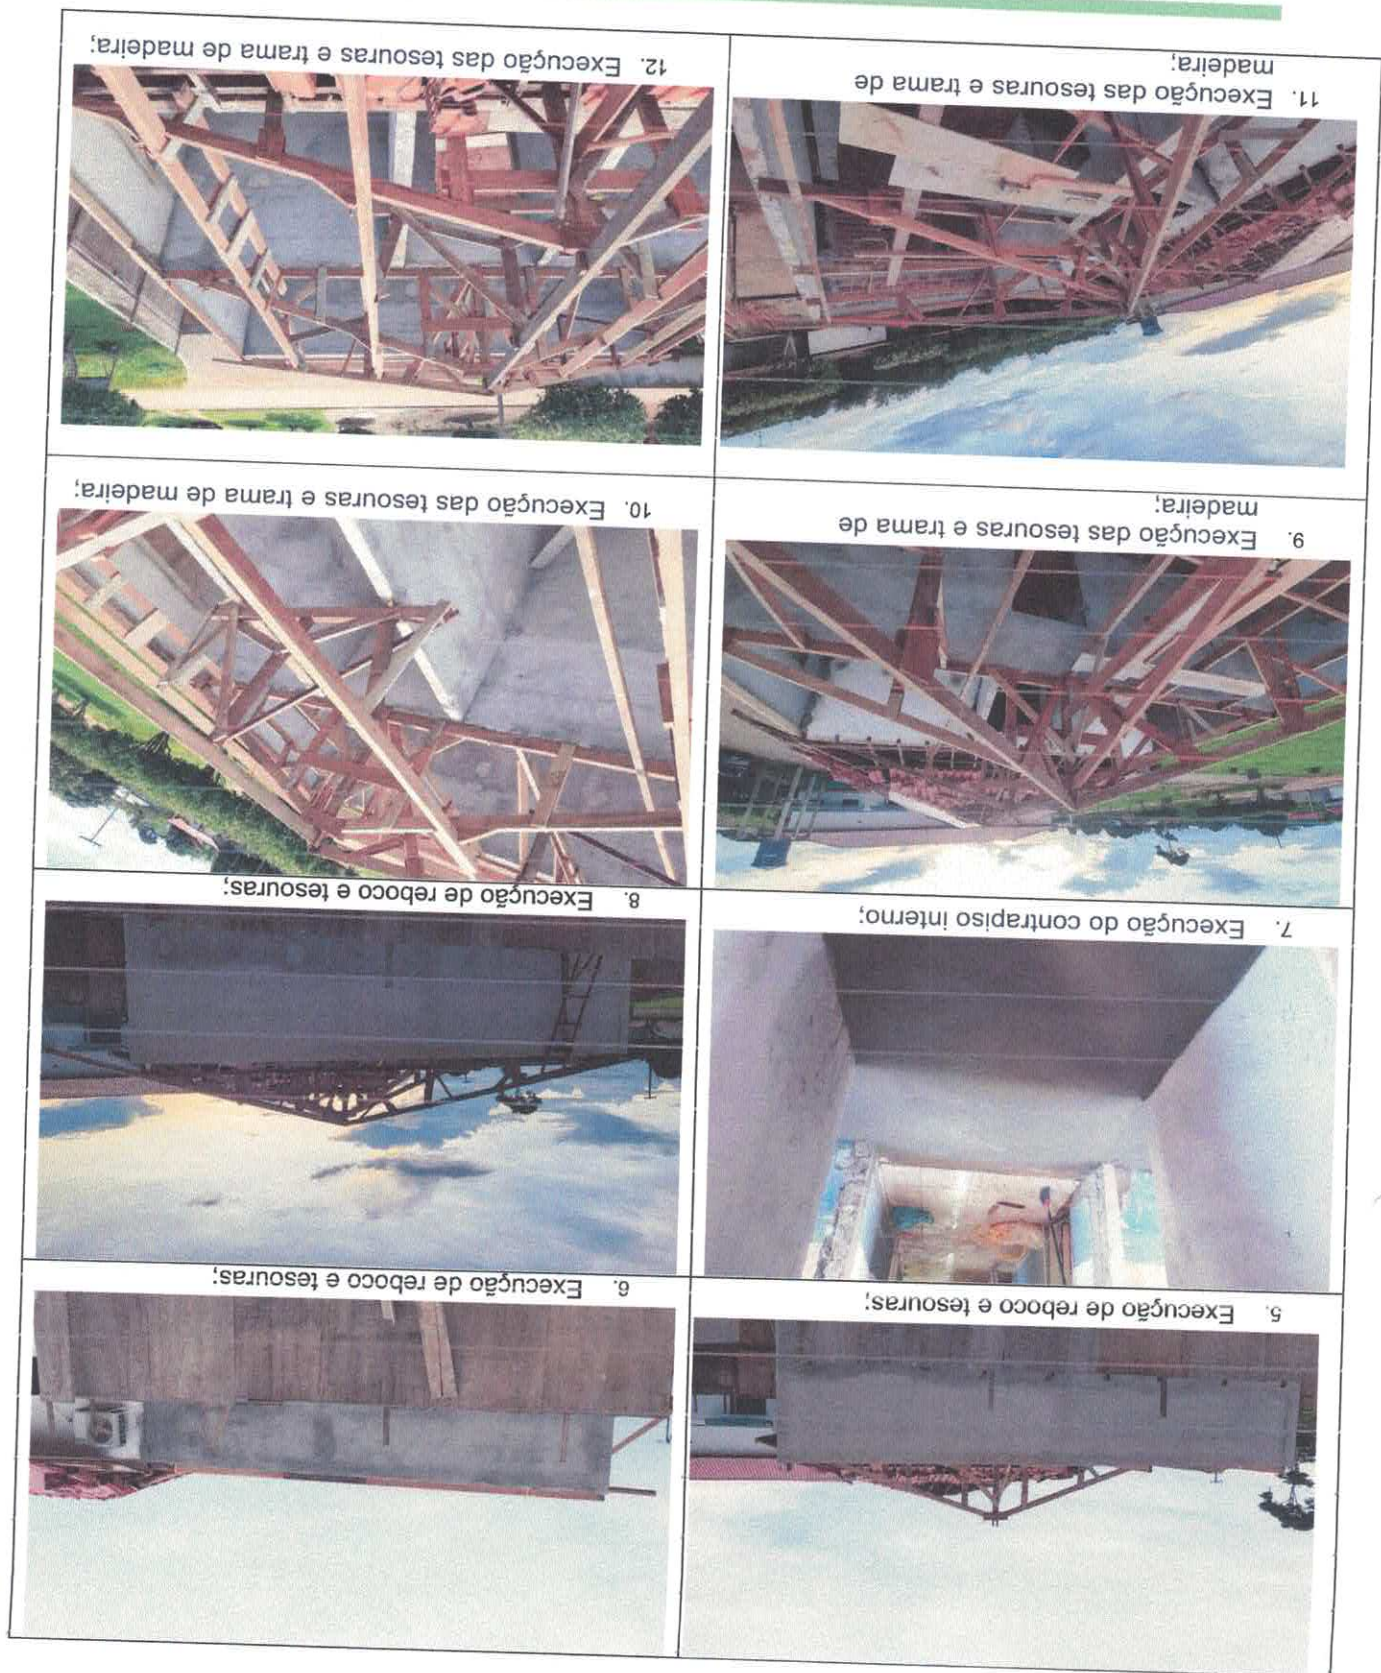


RUA DOM AUGUSTO, 892, CENTRO, JI-PARANA/RONDÔNIA, CEP 76900-077
EMAIL: trianguloengenhariaarquitetura@gmail.com



13. Execução das tesouras e trama de madeira;



15. Execução do telhamento;

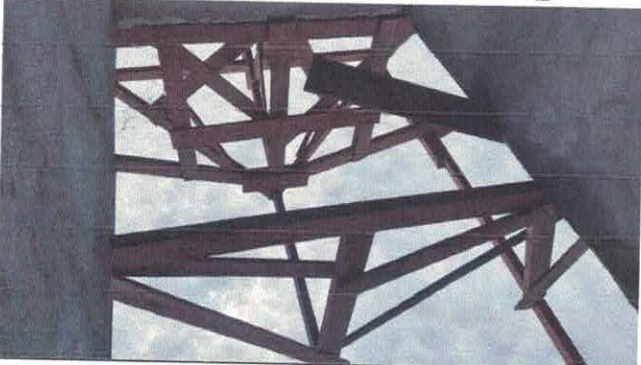


14. Execução das tesouras e trama de madeira;



16. Execução do telhamento;



17. Execução do telhamento

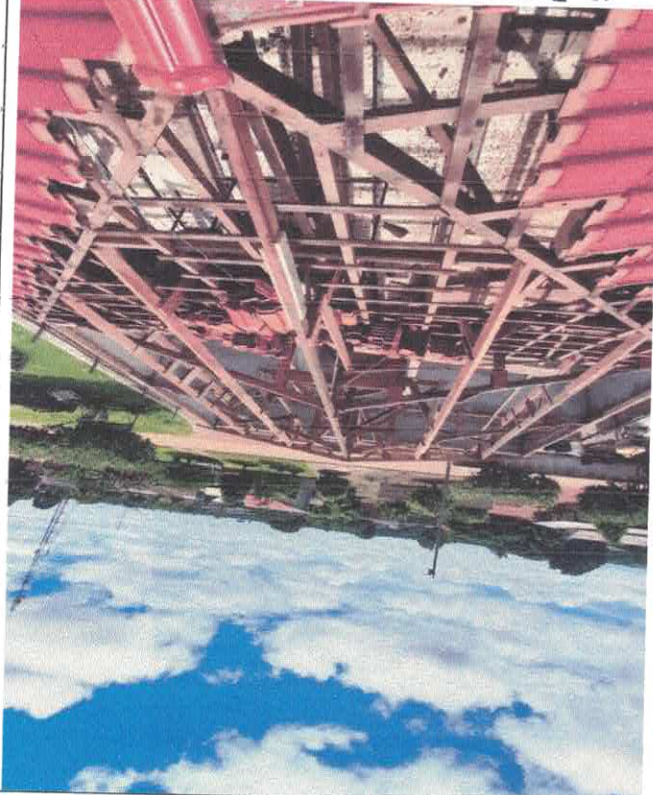

18. Remoção do madeiramento existente e das telhas;
